


# 新北市永和區竹林段 21 地號等 25 筆新建工程案- 案名『M PLUS』

## 施工進度


<b>開工核准</b>	<b>開工典禮</b>												
<p>113永建字第00131號</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> A-申報</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> A1-施工計畫</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> A2-開工</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> A3-放樣</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> A4-填土安全維護措施</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> A5-基礎板</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> A6-各層勘驗</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 竣工勘驗(尚未開放)</li> </ul>	<p>基本資料</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>申報項目</td><td>A2-開工</td></tr> <tr> <td>審查狀態</td><td>核准</td></tr> <tr> <td>第一次送件日期</td><td>2025/01/07</td></tr> <tr> <td>最新送件日期</td><td>2025/01/07</td></tr> <tr> <td>審查日期</td><td>2025/01/13</td></tr> <tr> <td>是否開放同時送件</td><td>否</td></tr> </table> <p>上繳資料    軌照列管事項</p>	申報項目	A2-開工	審查狀態	核准	第一次送件日期	2025/01/07	最新送件日期	2025/01/07	審查日期	2025/01/13	是否開放同時送件	否
申報項目	A2-開工												
審查狀態	核准												
第一次送件日期	2025/01/07												
最新送件日期	2025/01/07												
審查日期	2025/01/13												
是否開放同時送件	否												
<b>放樣勘驗</b>													
<p>113永建字第00131號</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> A-申報</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> A1-施工計畫</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> A2-開工</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> A3-放樣</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> A4-填土安全維護措施</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> A5-基礎板</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> A6-各層勘驗</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 竣工勘驗(尚未開放)</li> </ul>	<p>基本資料</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>申報項目</td><td>A3-放樣</td></tr> <tr> <td>審查狀態</td><td>核准</td></tr> <tr> <td>第一次送件日期</td><td>2025/03/25</td></tr> <tr> <td>最新送件日期</td><td>2025/03/25</td></tr> <tr> <td>審查日期</td><td>2025/03/28</td></tr> <tr> <td>是否開放同時送件</td><td>否</td></tr> </table> <p>上繳資料    軌照加註事項    軌照列管</p>	申報項目	A3-放樣	審查狀態	核准	第一次送件日期	2025/03/25	最新送件日期	2025/03/25	審查日期	2025/03/28	是否開放同時送件	否
申報項目	A3-放樣												
審查狀態	核准												
第一次送件日期	2025/03/25												
最新送件日期	2025/03/25												
審查日期	2025/03/28												
是否開放同時送件	否												
<b>假設工程(預計時程 114.3.29-114.5.31)</b>													
<b>導溝施作</b>													
													

實施者：晏京國際開發股份有限公司  
營造廠：暘昌營造股份有限公司

新北市永和區竹林段 21 地號等 25 筆新建工程案-  
案名『M PLUS』

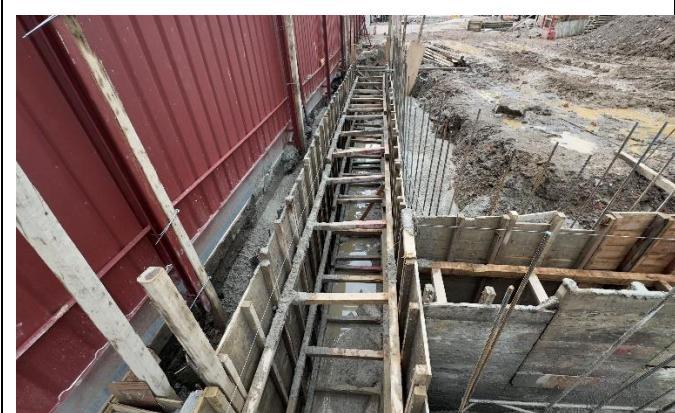


預壘樁施作

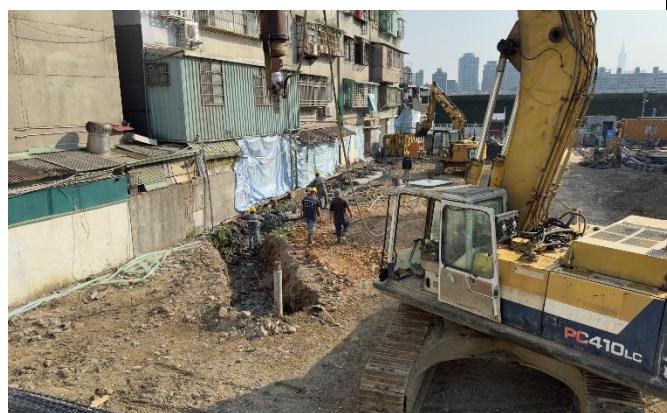

土坑施作



新北市永和區竹林段 21 地號等 25 筆新建工程案-  
案名『M PLUS』

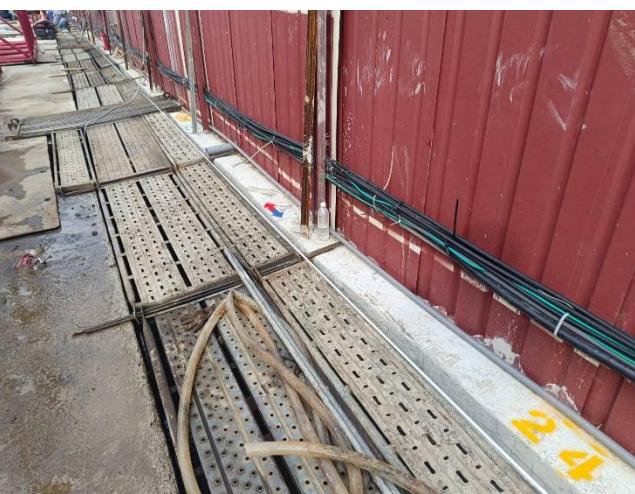	
<p>連續壁工程(預計時程 114. 5. 31-114. 9. 20)</p>	
連續壁單元分割放樣	
	
鋼筋床製作	
	
連續壁挖掘灌漿	

新北市永和區竹林段 21 地號等 25 筆新建工程案-  
案名『M PLUS』



鋼筋籠製作吊放



樁底灌漿



地質改良工程(預計時程 114. 9. 20-114. 12. 31)

改良樁封底

新北市永和區竹林段 21 地號等 25 筆新建工程案-  
案名『M PLUS』



主體結構體工程(預計時程 114. 12. 15-)

第一層開挖

