


新北市永和區竹林段 21 地號等 25 筆新建工程案-
案名『M PLUS』


施工進度													
開工核准	開工典禮												
繳交勘驗文件及明細 113永建字第00131號 A-申報 A1-施工計畫 A2-開工 A3-放樣 A4-環土安全維護措施 A5-基礎板 A6-各層勘驗 竣工勘驗(尚未開放) 基本資料 <table><tr><td>申報項目</td><td>A2-開工</td></tr><tr><td>審查狀態</td><td>核准</td></tr><tr><td>第一次送件日期</td><td>2025/01/07</td></tr><tr><td>最新送件日期</td><td>2025/01/07</td></tr><tr><td>審查日期</td><td>2025/01/13</td></tr><tr><td>是否開放同時送件</td><td>否</td></tr></table> 上繳資料 執照列管事項	申報項目	A2-開工	審查狀態	核准	第一次送件日期	2025/01/07	最新送件日期	2025/01/07	審查日期	2025/01/13	是否開放同時送件	否	
申報項目	A2-開工												
審查狀態	核准												
第一次送件日期	2025/01/07												
最新送件日期	2025/01/07												
審查日期	2025/01/13												
是否開放同時送件	否												
放樣勘驗													
繳交勘驗文件及明細 113永建字第00131號 A-申報 A1-施工計畫 A2-開工 A3-放樣 A4-環土安全維護措施 A5-基礎板 A6-各層勘驗 竣工勘驗(尚未開放) 基本資料 <table><tr><td>申報項目</td><td>A3-放樣</td></tr><tr><td>審查狀態</td><td>核准</td></tr><tr><td>第一次送件日期</td><td>2025/03/25</td></tr><tr><td>最新送件日期</td><td>2025/03/25</td></tr><tr><td>審查日期</td><td>2025/03/28</td></tr><tr><td>是否開放同時送件</td><td>否</td></tr></table> 上繳資料 執照加註事項 執照列管事項	申報項目	A3-放樣	審查狀態	核准	第一次送件日期	2025/03/25	最新送件日期	2025/03/25	審查日期	2025/03/28	是否開放同時送件	否	
申報項目	A3-放樣												
審查狀態	核准												
第一次送件日期	2025/03/25												
最新送件日期	2025/03/25												
審查日期	2025/03/28												
是否開放同時送件	否												
假設工程(預計時程 114. 3. 29-114. 5. 31)													
導溝施作													
													

實施者：晏京國際開發股份有限公司
營造廠：陽昌營造股份有限公司

新北市永和區竹林段 21 地號等 25 筆新建工程案- 案名『M PLUS』

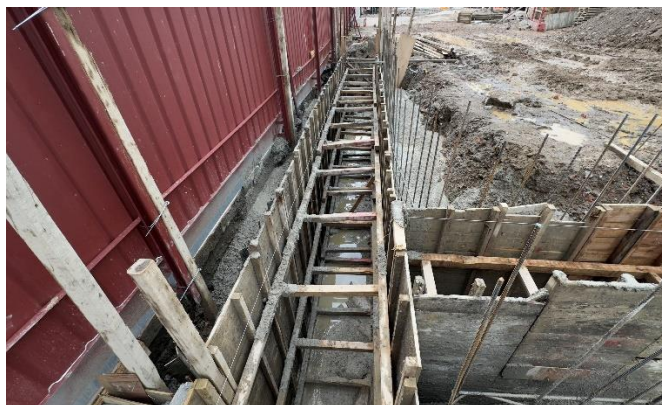

預壘樁施作

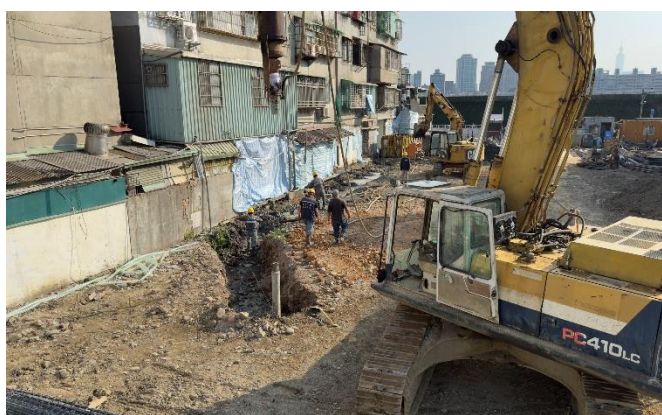

土坑施作




新北市永和區竹林段 21 地號等 25 筆新建工程案- 案名『M PLUS』





連續壁工程(預計時程 114. 5. 31-114. 9. 20)

連續壁單元分割放樣

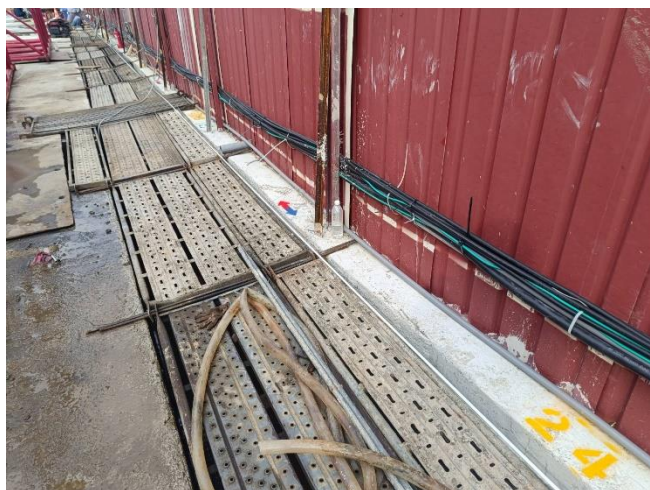

鋼筋床製作

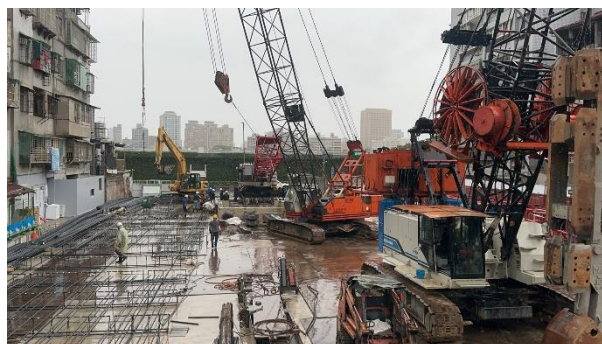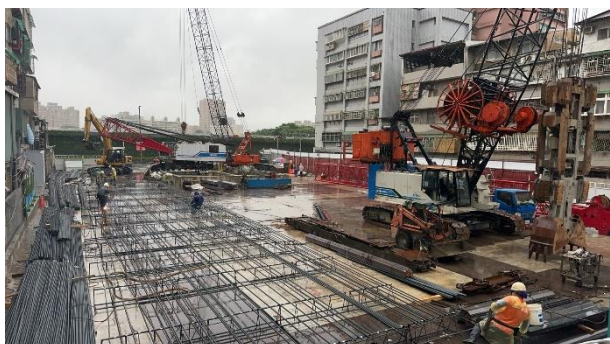


連續壁挖掘灌漿

實施者：晏京國際開發股份有限公司
營造廠：暘昌營造股份有限公司

新北市永和區竹林段 21 地號等 25 筆新建工程案- 案名『M PLUS』



鋼筋籠製作吊放

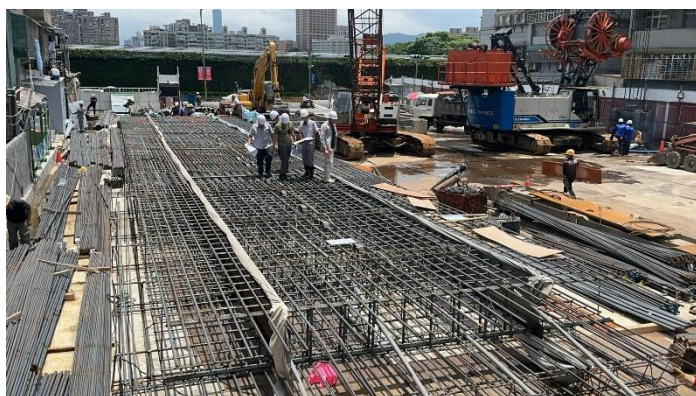

樁底灌漿



地質改良工程(預計時程 114. 9. 20-114. 12. 31)

改良樁封底

新北市永和區竹林段 21 地號等 25 筆新建工程案- 案名『M PLUS』



主體結構體工程(預計時程 114. 12. 15-115. 2. 13)

開挖




鋼結構工程(預計時程 115. 2. 23-115. 07. 23)


新北市永和區竹林段 21 地號等 25 筆新建工程案-
案名『M PLUS』




鋼結構安裝

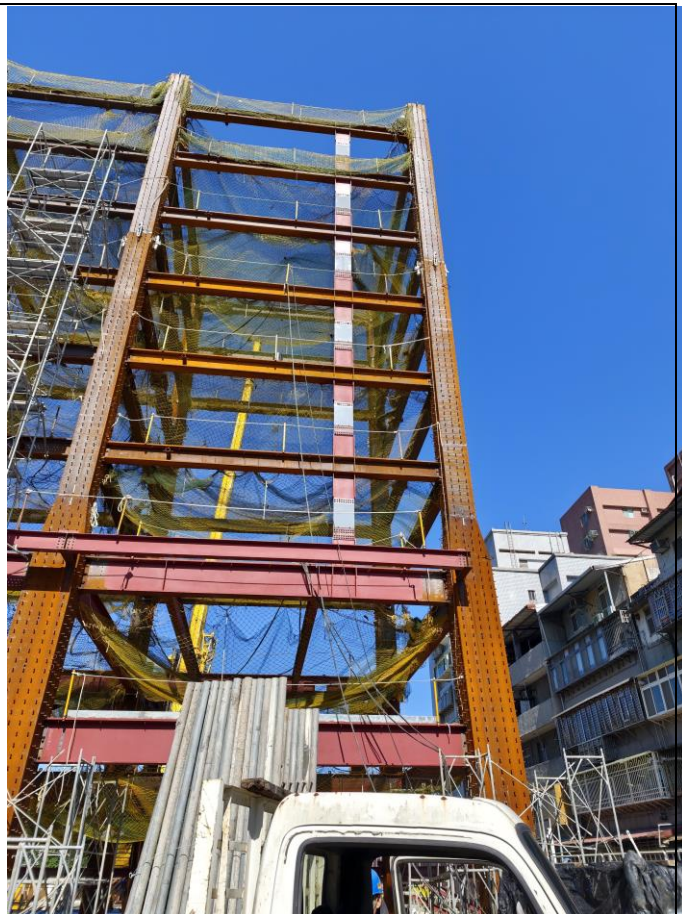

制震壁安裝

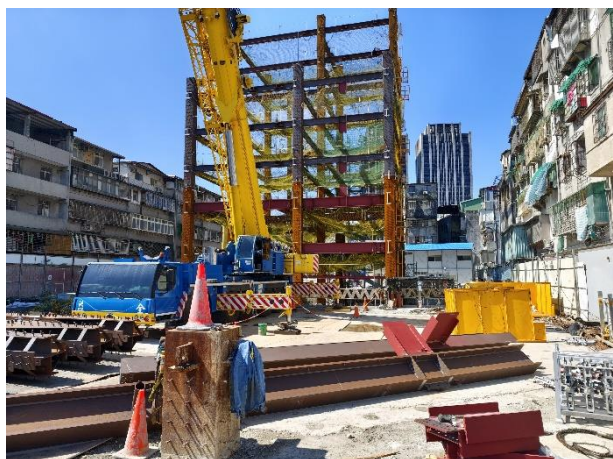

鋼結構安裝

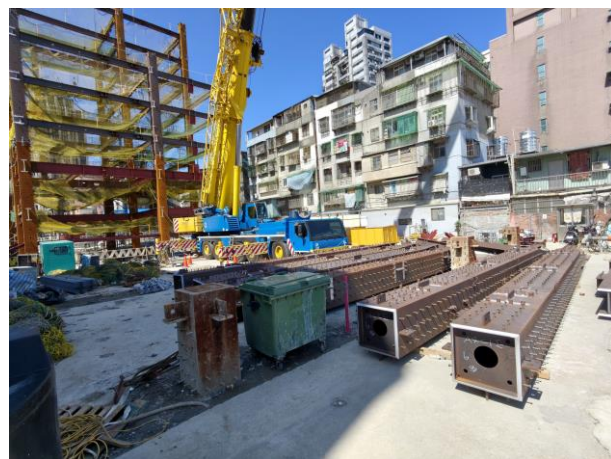

鋼結構安裝

新北市永和區竹林段 21 地號等 25 筆新建工程案-
案名『M PLUS』



鋼構安裝完成



塔吊安裝完成



1 樓車道結構混凝土澆置



一樓板鋪設

預計時程 115.07.10 1FL 完成
