

# 新北市永和區竹林段 21 地號等 25 筆新建工程案- 案名『M PLUS』

## 施工進度

### 開工核准

繳交勘驗文件及明細

113永建字第00131號

A-申報

- A1-施工計畫
- A2-開工
- A3-放樣
- A4-環土安全維護措施
- A5-基礎板
- A6-各層勘驗
- 竣工勘驗(尚未開放)

基本資料

申報項目	A2-開工
審查狀態	核准
第一次送件日期	2025/01/07
最新送件日期	2025/01/07
審查日期	2025/01/13
是否開放同時送件	否

上傳資料 執照列管事項

### 開工典禮



### 放樣勘驗

繳交勘驗文件及明細

113永建字第00131號

A-申報

- A1-施工計畫
- A2-開工
- A3-放樣
- A4-環土安全維護措施
- A5-基礎板
- A6-各層勘驗
- 竣工勘驗(尚未開放)

基本資料

申報項目	A3-放樣
審查狀態	核准
第一次送件日期	2025/03/25
最新送件日期	2025/03/25
審查日期	2025/03/28
是否開放同時送件	否


上傳資料 執照加註事項 執照列管

### 假設工程(預計時程 114. 3. 29-114. 5. 31)


#### 導溝施作



# 新北市永和區竹林段 21 地號等 25 筆新建工程案- 案名『M PLUS』

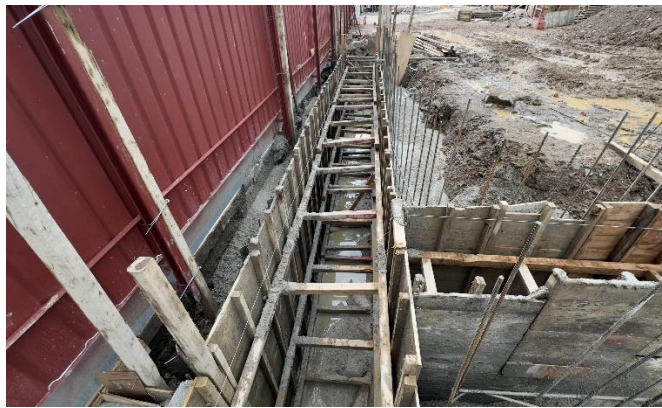

預壘樁施作

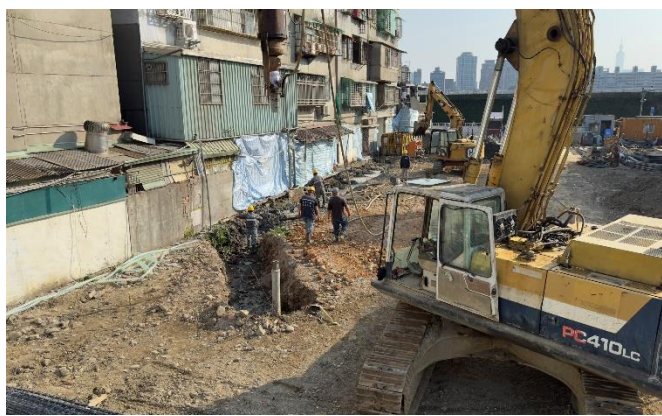

土坑施作




# 新北市永和區竹林段 21 地號等 25 筆新建工程案- 案名『M PLUS』





連續壁工程(預計時程 114. 5. 31-114. 9. 20)

連續壁單元分割放樣

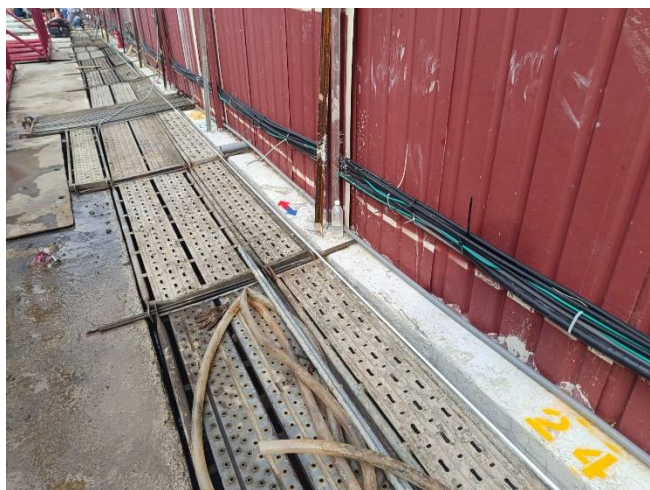

鋼筋床製作

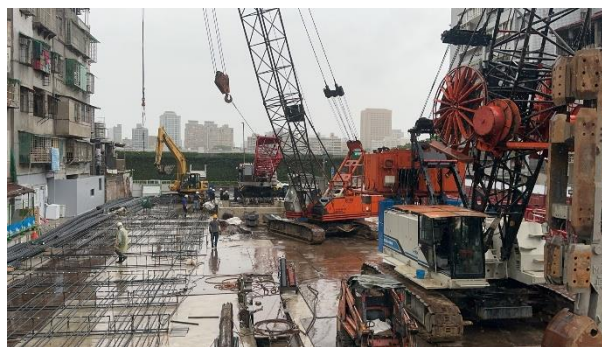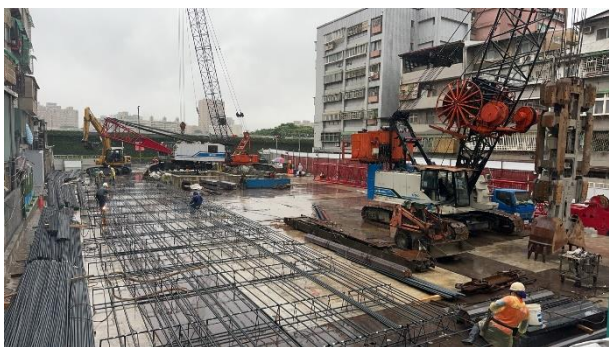


連續壁挖掘灌漿

# 新北市永和區竹林段 21 地號等 25 筆新建工程案- 案名『M PLUS』



鋼筋籠製作吊放

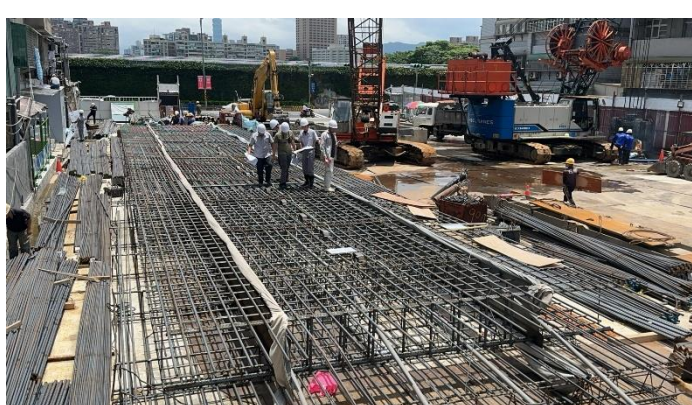

樁底灌漿



地質改良工程(預計時程 114. 9. 20-114. 12. 31)

改良樁封底

# 新北市永和區竹林段 21 地號等 25 筆新建工程案- 案名『M PLUS』



主體結構體工程(預計時程 114. 12. 15-115. 2. 13)

開挖



鋼結構工程(預計時程 115. 2. 23-115. 07. 23)


新北市永和區竹林段 21 地號等 25 筆新建工程案-  
案名『M PLUS』



鋼結構安裝



制震壁安裝

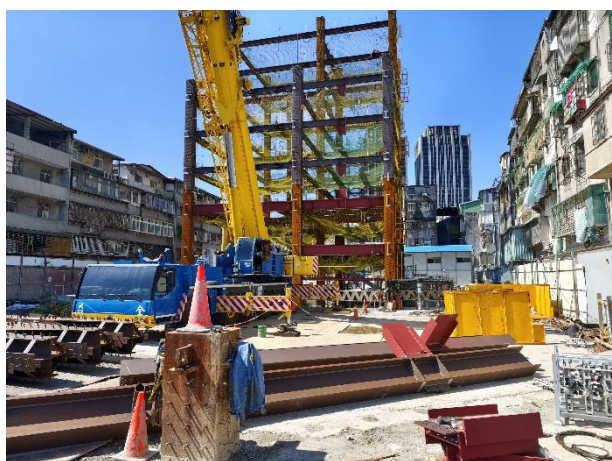

鋼結構安裝



鋼結構安裝
